


ID	Ak	Aktivitetsnavn	Varighet	gjennomføres:	Start	Slutt	Tidslinje											
							des	Kv 1, 2019			Kv 2, 2019			Kv 3, 2019			aug	sep
							jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep			
1	★	Forberedende arbeid																
2	■	Bygging av boliger for funksjonshemmede (Otta brygge)	3 ukr	jan. 2019	02.01.2019	22.01.2019												
3	■	Flytting av beboere fra Elvebakken	2 ukr	jan. 2019	23.01.2019	05.02.2019												
4	■	Erverv av eiendom for nye lokaler til aktivitetssenter og hjelpemiddelsentral (Skansen 16 /GIAX)	1 mnd	jan. 2019	02.01.2019	29.01.2019												
5	■	Tilrettelegging/ombygging av Skansen 16	3,5 mndr	mars-jun.2019	01.03.2019	17.06.2019												
6	■	Flytting av hjelpemiddelsentral og aktivitetssenter	1 uk	jun. 2019	18.06.2019	24.06.2019												
7	■	Anbud/kontrahering av riveentreprenør	3 mndr	mars-jun.2019	22.03.2019	25.06.2019												
8	■	Riving/sannering av Elvebakken	3 mndr	jun.-sept. 2019	25.06.2019	16.09.2019												
9	■																	
10	★	NYE OTTA SKOLE 1-7																
11	■	rom og funksjonsprogram	15 ukr	jan.-apr 2019	27.12.2018	11.04.2019												
12	■	kvalitetsikring rom og funksjonsprogram	3 ukr	april 2019	12.04.2019	08.05.2019												
13	■	Skisse, prosjektering	8 mndr	mars-nov 2019	09.05.2019	23.12.2019												
14	■	anbud/kontrahering	3 mndr	nov. 2019- feb. 2020	24.12.2019	19.03.2020												
15	■	Bygging av ny skole	18 mndr	feb. 2020- aug. 2021	20.03.2020	25.08.2021												
16	★																	
17	★	NY HALL																
18	■	rom og funksjonsprogram	2 mndr	jan.-feb. 2019	02.01.2019	26.02.2019												
19	■	Skisse	2 mndr	feb.-mars 2019	06.02.2019	02.04.2019												
20	■	kvalitetsikring rom og funksjonsprogram	1 mnd	april 2019	01.04.2019	02.05.2019												
21	■	detaljing, prosjektering	4 mndr	mars-jul. 2019	03.05.2019	27.08.2019												
22	■	anbud/kontrahering	3 mndr	nov. 2019- feb. 2020	15.11.2019	11.02.2020												
23	■	Tilrettelegging for ny hall (Arbeid i grunn med VA, fjernvarme, overvann, høyspent kabler, fiber)	3 mndr	apr. 2020-jul. 2020	15.04.2020	10.07.2020												
24	■	Riving Samfunnshus	2 mndr	jul.- sept. 2020	13.07.2020	04.09.2020												
25	■	Bygging ny hall	12 mndr	sept. 2020-aug. 2021	07.09.2020	18.08.2021												
26	★																	
27	★	Informasjonsplan																
28	■	Informasjon formannskapet	1 dag?	19.03.2019	19.03.2019	19.03.2019												
29	■	Informasjon lederforum	1 dag?	21.03.2019	21.03.2019	21.03.2019												
30	■	Informasjon Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	1 dag?	21.03.2019	21.03.2019	21.03.2019												
31	■	Informasjon trafikksikkerhetsutvalg	1 dag?	25.03.2019	25.03.2019	25.03.2019												
32	■	informasjon hjemmeside	1 dag?	05.04.2019	05.04.2019	05.04.2019												
33	■	Åpent møte for innbyggere Sel kommune	1 dag?	29.04.2019	29.04.2019	29.04.2019												
34	■	Informasjon Kommunestyret	1 dag?	06.05.2019	06.05.2019	06.05.2019												
35	★	Informasjon elever og foresatte																
36	■	Informasjon Driftsutvalg	1 dag?	13.05.2019	13.05.2019	13.05.2019												

Prosjekt: Otta skole 1-7 og hall Dato: 28.03.2019	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			

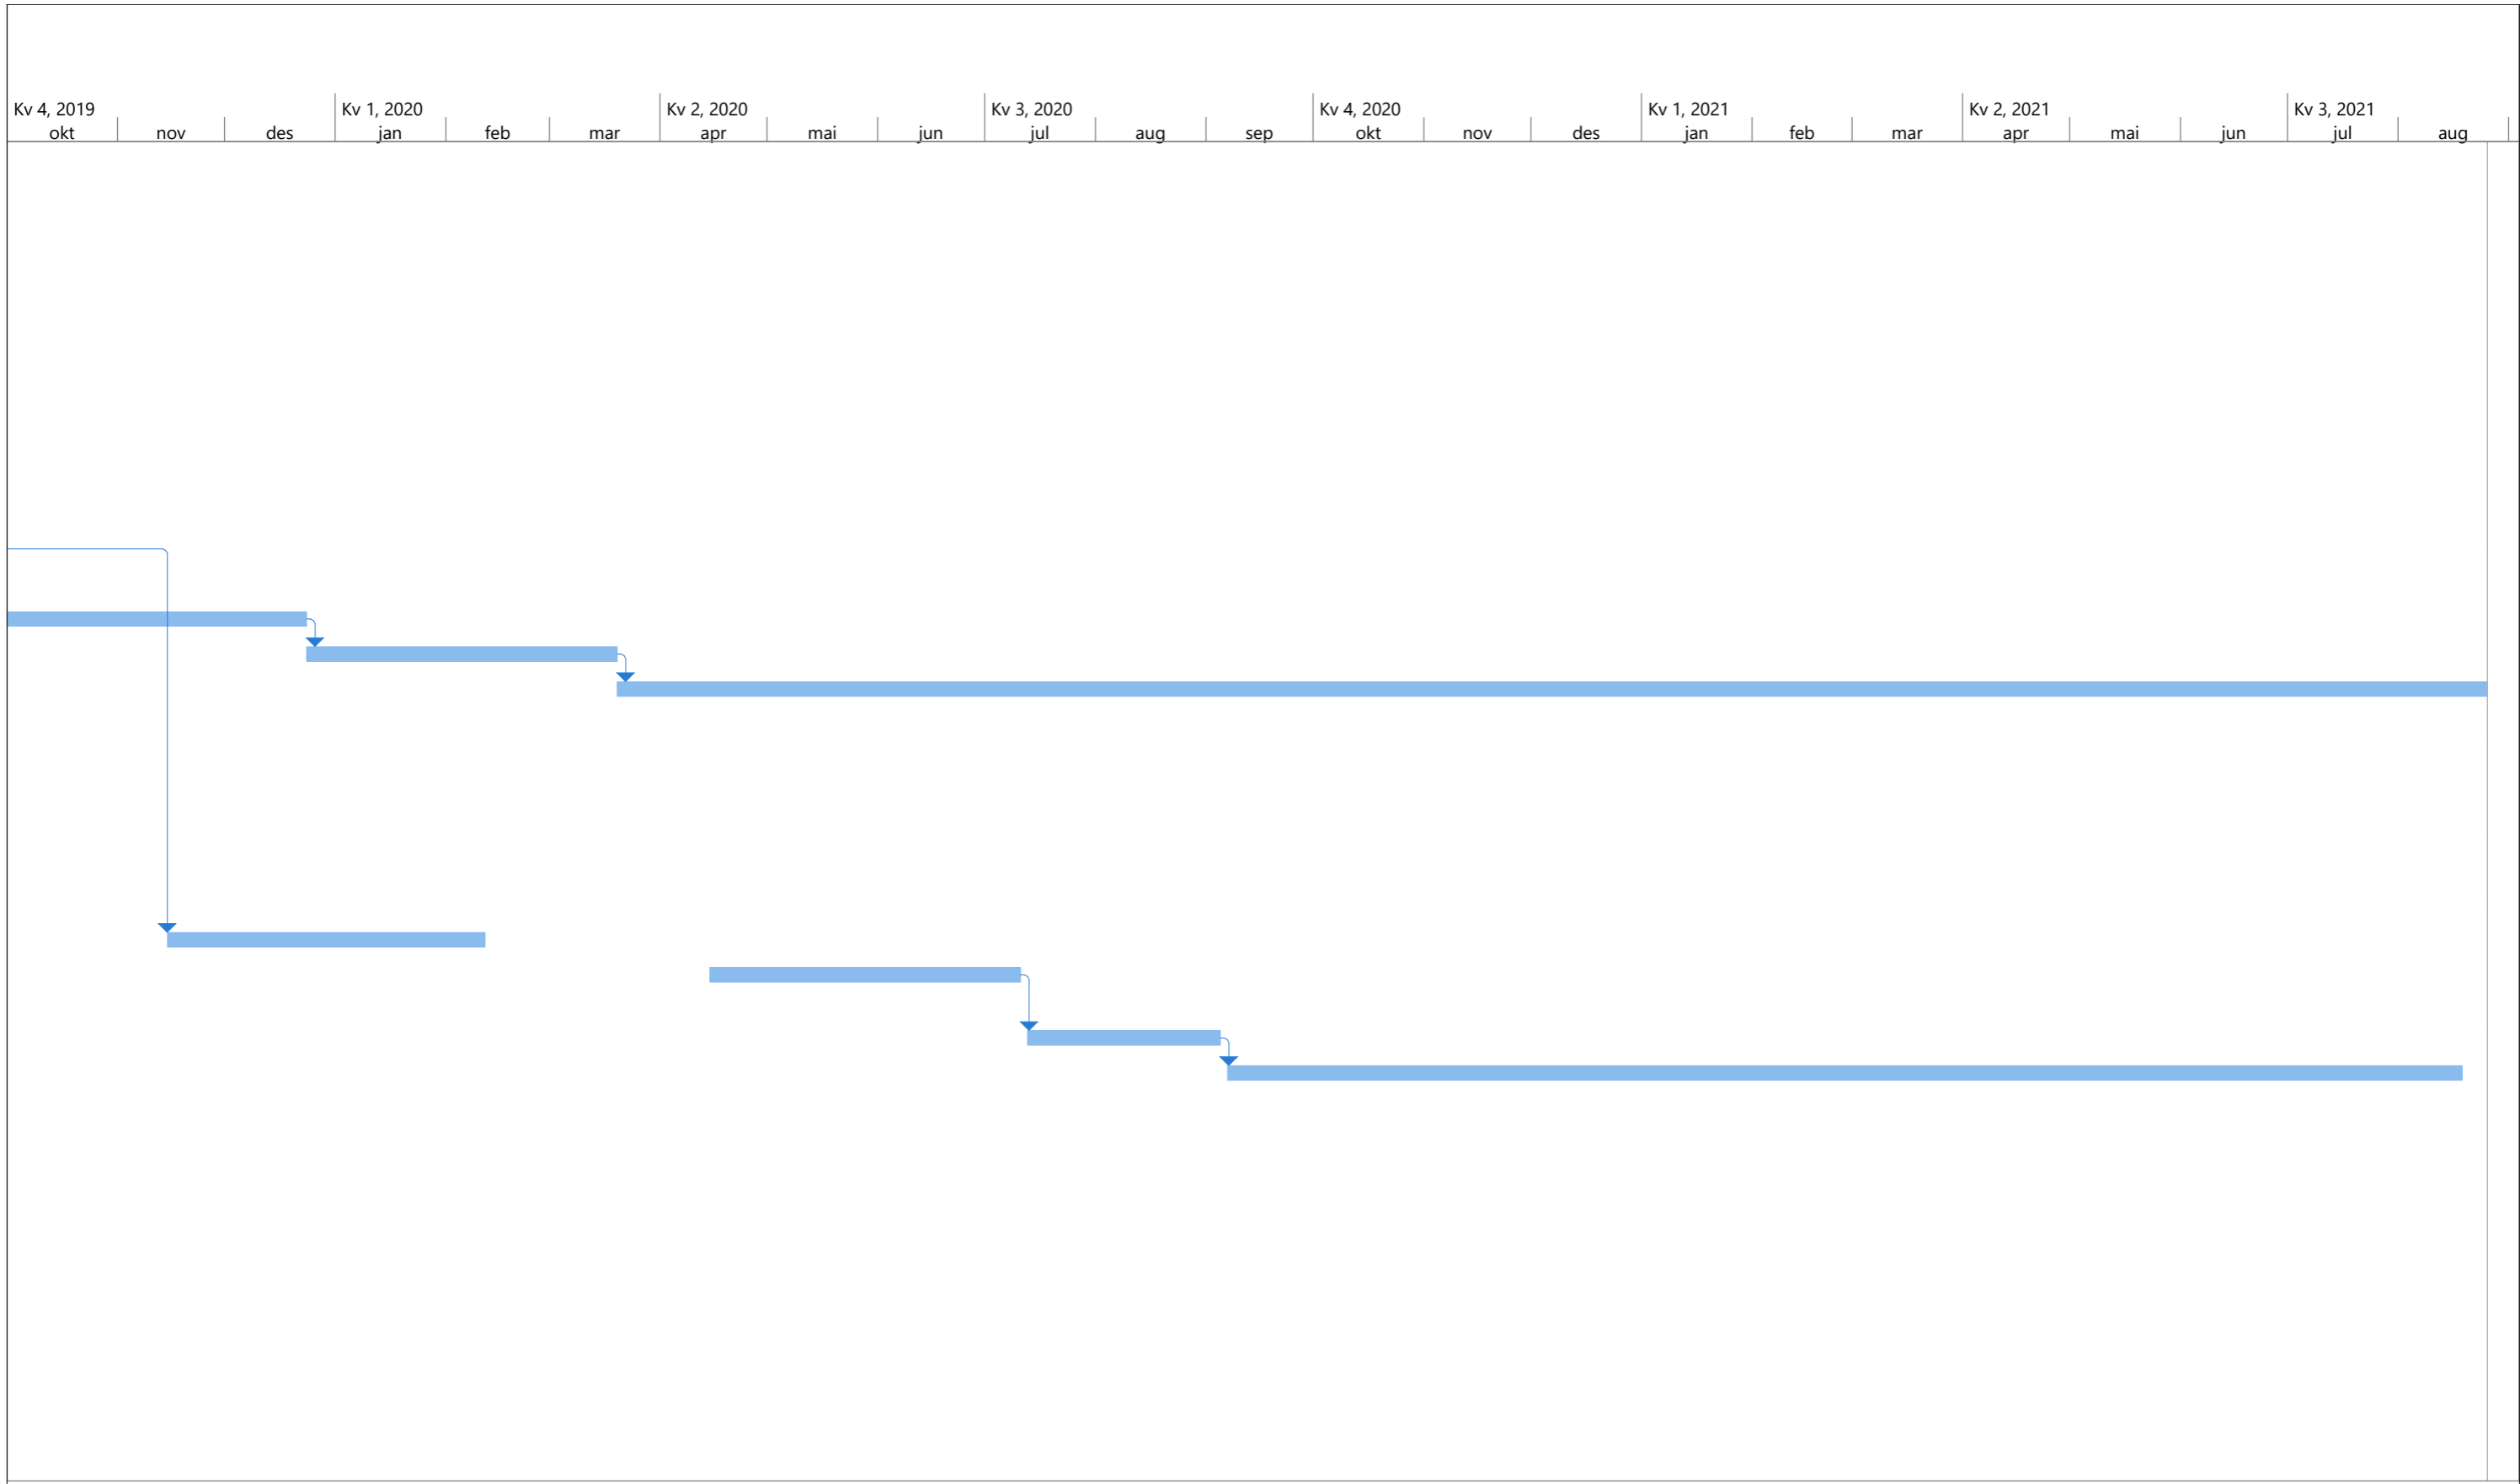

Prosjekt: Otta skole 1-7 og hall Dato: 28.03.2019	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			
